

COLAS BELGIUM
WE OPEN THE WAY

ANHÉE

PLACE D'ANNEVOIE

COLAS

WE OPEN THE WAY



SUIVI DU CHANTIER ET PLANNING ASSOCIÉ



TRAVAUX EN COURS



WE OPEN THE WAY

- ⇒ Travaux impétrants (Tranchée commune + pénétrantes)
- ⇒ Station de pompage
- ⇒ Pertuis de la place
- ⇒ Pertuis du pont



TRAVAUX EN COURS




WE OPEN THE WAY

⇒ Travaux impétrants (Tranchée commune + pénétrantes)

⇒ 3 phases :

- Phase 1 (vert) : terminée
- Phase 2 (rose) : en cours
- Raccordement AIEM en juillet
- Terrassement raccordement riverains en août
- Pose impétrants fin août
- Phase 3 (bleu) : à venir
- De mi septembre à fin septembre

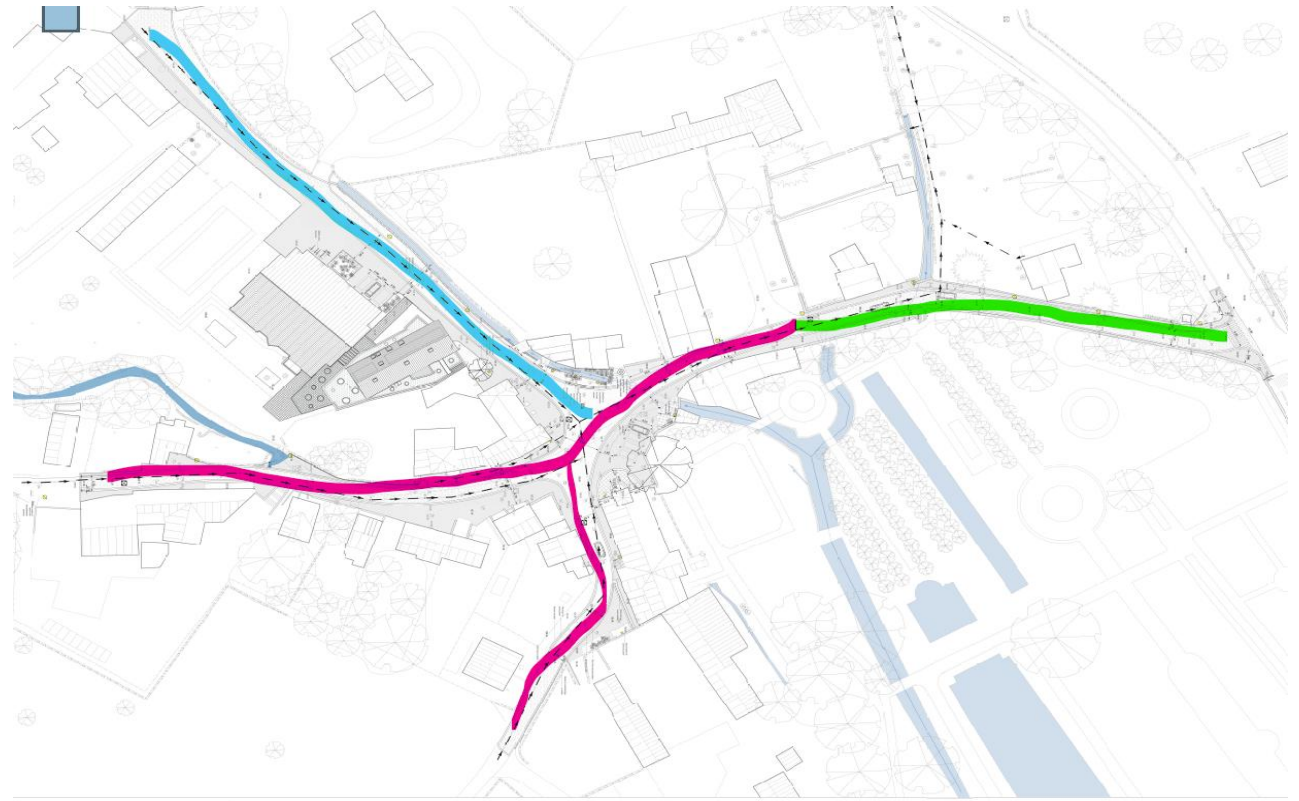

TRAVAUX EN COURS

⇒ Station de pompage

⇒ En place, mise en service semaine du 11/8



WE OPEN THE WAY



TRAVAUX EN COURS

⇒ **Pertuis de la place**

*** Dalle de couverture posée**

*** Dernier coffrage/ferrailage/bétonnage à réaliser avant les congés du bâtiment**



WE OPEN THE WAY



TRAVAUX EN COURS



⇒ **Pertuis du pont**

⇒ **En cours de finition**

- ⇒ Travaux de voirie et aménagement de la place
- ⇒ Rénovation du four à pain / Rénovation de la roue à eau



POINT PLANNING

Planning Chantier :

⇒ Fin impétrants pour début octobre

⇒ Travaux de voirie – fin de chantier prévue fin février

Travaux de voirie réalisés par antenne (identique impétrants) sauf certaines tâches (fondation, pavages, ...)

⇒ Four à pain (à partir de mi-août et +/- 2 mois)

⇒ Roue à eau (octobre 2025 pour +/- 3j)



WE OPEN THE WAY




POINT PLANNING



Contraintes chantier :

- Nuisances liées aux pompages de nuit : terminée (mais pompage ponctuelle de journée)
- Accessibilité riverains : restreinte jusqu'à fin février 2026 (parking école accessible pour les voitures)
- Objectif chantier : mise au propre (pose fondation) pour fin novembre 2025

⇒ Remplacement de l'asphalte gris par des pavés

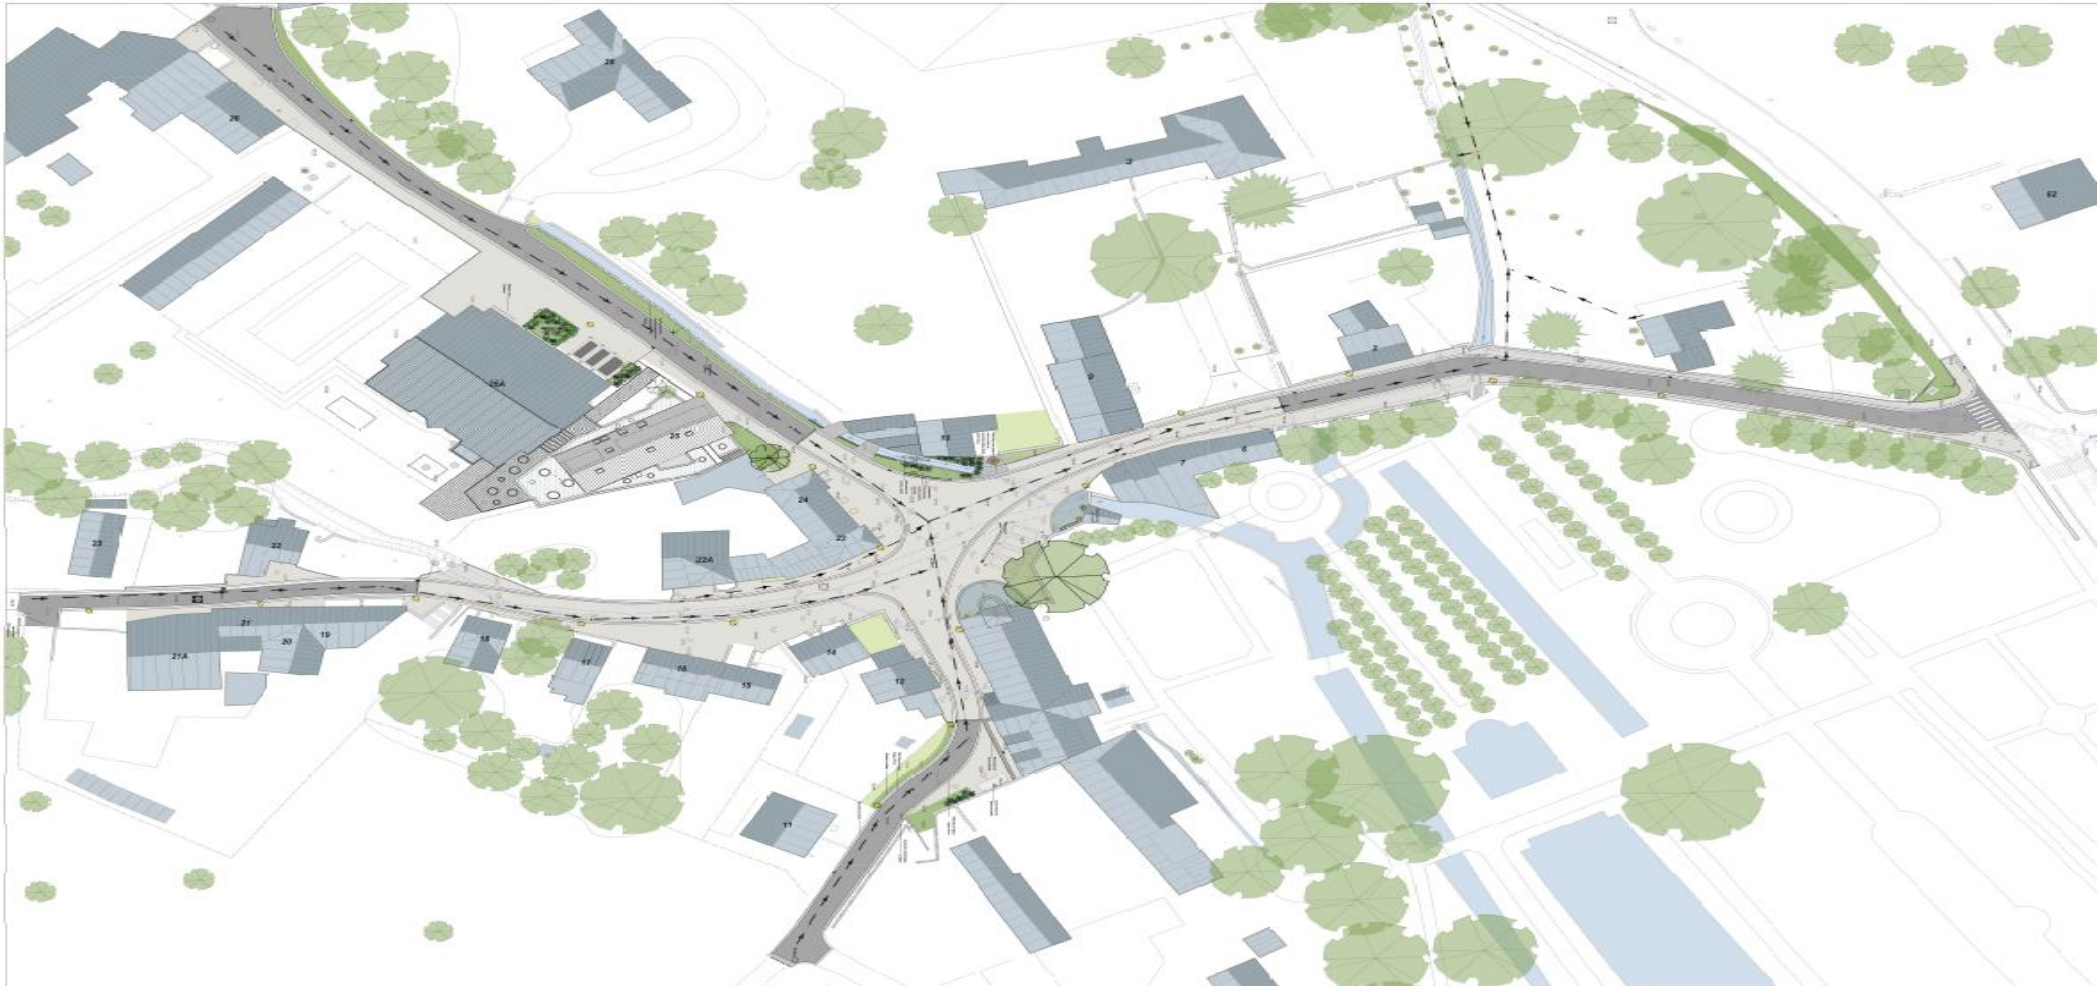

MERCI



DES QUESTIONS ?
